

Documentación de Procedimientos

Procedimiento: Gestión de proyectos de investigación e innovación sin convocatoria

Versión No: 1.0

Número de Páginas: 29

Vigencia: Desde la fecha de suscripción del presente documento por parte de la primera autoridad ejecutiva o su delegado.

Deroga a: Ninguno

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Dirección general de investigación e innovación	Vicerrectorado de investigación	Primera autoridad ejecutiva o su delegado
Dirección general de planificación y procesos	Dirección general de investigación e innovación	
	Dirección general de planificación y procesos	
	Dirección general jurídica	

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Responsable del procedimiento	3
4. Definiciones	3
5. Abreviaturas	10
6. Consideraciones	10
6.1. Generales	10
6.2. Específicas	14
3. Diagrama de flujo	19
3.1. Presentación de Proyecto de Investigación o Innovación	19
3.2. Seguimiento de proyectos de investigación o innovación	20
3.3. Suspensión y cancelación de proyectos de investigación e innovación.....	20
3.4. Cierre de proyectos de investigación e innovación.....	21
4. Detalle de actividades	21
4.1. Presentación de proyecto de investigación e innovación	21
4.2. Seguimiento de proyectos de investigación e innovación	23
4.3. Suspensión y cancelación de Proyectos de Investigación e Innovación.....	26
4.4. Cierre de proyectos de investigación e innovación.....	28
5. Formatos	29
6. Normativa base	29
7. Indicadores del procedimiento	29
8. Riesgos operacionales del procedimiento	29
9. Histórico de cambios	29

1. Objetivo

Establecer un marco estructurado y eficiente que facilite la presentación, ejecución, seguimiento, suspensión, cancelación, cierre, y evaluación de los proyectos de investigación e innovación sin convocatoria presentados por el personal académico de la UITEY.

2. Alcance

Aplica a todas las unidades académicas que realicen investigación a través de proyectos de investigación o innovación sin convocatoria y con financiamiento en especie, es decir, mediante el pago de su salario asociado a las horas de trabajo empleadas para la ejecución del proyecto y el uso de las instalaciones, materiales, reactivos, equipos, entre otros, disponibles en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Inicia desde el ingreso de la solicitud de aprobación del proyecto y finaliza exitosamente con la emisión de constancia de cierre del proyecto de investigación o innovación.

Los subprocesos en alcance se detallan a continuación:

1. Presentación de proyecto de investigación e innovación
2. Seguimiento de proyectos de investigación e innovación
3. Suspensión y cancelación de proyectos de investigación e innovación
4. Cierre de proyectos de investigación e innovación

3. Responsable del procedimiento

El responsable del procedimiento es la dirección general de investigación e innovación.

4. Definiciones

Término	Definición
Antecedentes y justificación	Los antecedentes se refieren a la información contextual, teórica o histórica que proporciona el marco necesario para comprender el problema o la pregunta de investigación. Estos antecedentes sirven para establecer la relevancia, la necesidad y la justificación del proyecto. Mientras que la justificación, se debe responder por qué es preciso analizar determinado problema. Este problema puede ser novedoso o presentarse bajo una forma novedosa. Por eso, es central dejar marcado por qué debería realizarse una investigación exhaustiva sobre el eje del trabajo. Para ello debemos preguntarnos: ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Ayudará a resolver algún problema

Término	Definición
	práctico? ¿Se aportará al conocimiento? ¿Tendrá algún aporte a la tecnología? Si las respuestas en estas preguntas son claras, bien fundamentadas y están dentro del contenido propuesto, significa que este estudio se justifica y puede ser llevado a la práctica.
Cancelación	Se refiere a la terminación definitiva del proyecto, sin posibilidad de reactivación, y no se considera cierre exitoso del proyecto.
Cierre	Es la fase final del proyecto en la que se consolidan, presentan y evalúan los resultados obtenidos, se cumple con los compromisos establecidos y se formaliza la terminación administrativa y técnica del proyecto Esta fase incluye la elaboración y entrega de: • El informe de cierre del proyecto de investigación o innovación. • Los productos esperados, incluyendo los propuestos en el plan de difusión (artículos, tesis, ponencias, patentes, etc.).
Desarrollo experimental	El desarrollo experimental implica la aplicación sistemática de conocimientos existentes obtenidos a través de la investigación para la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, o para la mejora sustancial de los ya existentes. Incluye la fase de diseño y prueba de prototipos Se concentra en la traducción práctica de conocimientos en nuevos productos, procesos o servicios, con énfasis en la experimentación y la creación de prototipos. Se enmarca en niveles de madurez tecnológica (Technology Readiness Level, TRL) 5 a 8.
Estado del arte de la investigación propuesta	El "estado del arte" en un proyecto de investigación se refiere a la revisión exhaustiva y crítica de la literatura y trabajos previos relacionados con el tema específico de investigación. También se conoce como "revisión bibliográfica" o "revisión de la literatura". El objetivo principal de esta sección es proporcionar un resumen actualizado y detallado de los conocimientos existentes en el área de estudio antes de que comience la investigación propuesta. Las características principales del estado del arte incluyen:

Término	Definición
	a) Revisión exhaustiva b) Identificación de trabajos clave c) Síntesis de conocimientos d) Identificación de brechas y problemas no resueltos e) Contextualización del proyecto de investigación f) Apoyo a la justificación del proyecto
Horas de dedicación	Las horas de dedicación del personal académico y de apoyo académico, deberán estar acordes al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior y que cumplan con lo establecido en el Instructivo de Distribución de trabajo del personal académico de la UITEY específicamente en las horas para investigación. Las horas de dedicación de los estudiantes a participar en los proyectos deberán ser aprobadas por el director del proyecto y pueden establecerse también a través de las ayudantías de investigación. Dependiendo del tipo de proyecto, las horas de dedicación serán aprobadas por la autoridad de la unidad académica a la que corresponde, previo a las firmas de responsabilidad.
Innovación tecnológica o comercialización	La innovación tecnológica implica la introducción de nuevas tecnologías, productos, procesos o servicios en el mercado. Puede derivar de la investigación y el desarrollo, y su objetivo es generar valor a través de la implementación exitosa de ideas novedosas. Se centra en la aplicación práctica de avances tecnológicos para mejorar productos o servicios existentes, o para introducir algo completamente nuevo en el mercado. Se enmarca en niveles de madurez tecnológica (Technology Readiness Level, TRL) 9.
Interculturalidad	Implica integrar conocimientos, metodologías y perspectivas de diversas culturas del Ecuador para generar soluciones más inclusivas, sostenibles y con mayor impacto social. Esto permite reconocer y valorar los saberes tradicionales, fomentar la participación de diversas comunidades y enriquecer el proceso investigativo.

Término	Definición
Investigación aplicada	La investigación aplicada utiliza los conocimientos generados por la investigación básica para abordar problemas o preguntas específicas con aplicaciones prácticas. Su objetivo principal es resolver problemas prácticos, mejorar productos o procesos existentes y proporcionar soluciones a desafíos concretos. Se enfoca en la aplicación directa de los conocimientos para abordar problemas prácticos y generar resultados útiles. Se enmarca en niveles de madurez tecnológica (Technology Readiness Level, TRL) 2 a 4
Investigación básica	La investigación básica, también conocida como investigación fundamental o pura, tiene como objetivo principal la ampliación del conocimiento sin tener en cuenta aplicaciones prácticas específicas. Se centra en la comprensión de principios fundamentales y leyes que rigen fenómenos naturales o sociales. Busca descubrir teorías y conceptos nuevos, sin la intención inmediata de aplicar los resultados a problemas prácticos. Se enmarca en niveles de madurez tecnológica (Technology Readiness Level, TRL) 1 o 2.
Objetivo general	Hace referencia al propósito global del trabajo, es decir, la intención principal, es la declaración amplia y general que describe lo que se espera lograr con el estudio en su conjunto. Es la meta principal que guía todo el trabajo de investigación y define el propósito global del proyecto. Este objetivo proporciona una visión general de lo que se pretende alcanzar y establece la dirección para la formulación de los objetivos específicos, la selección de la metodología y la interpretación de los resultados.
Objetivos específicos	Son las guías del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes entre sí. Deben ser expresados con claridad, directos y medibles, para que permitan guiar el proceso de investigación, siendo susceptibles de ser alcanzados. Deben ser enunciados en infinitivo, preferiblemente al menos tres, e intentar en lo posible plantear objetivos SMART, es decir, <i>específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos</i>.

Término	Definición
	Dentro del proceso de investigación, la formulación de objetivos nos permitirá: orientar las demás fases del proceso de investigación, determinar los límites y la amplitud del estudio, definir las etapas que requiere el estudio y situar el estudio dentro de un contexto general.
Plan de difusión	El plan de difusión en un proyecto de investigación es una estrategia que define cómo, cuándo y a través de qué medios se comunicarán los resultados y avances del proyecto a diferentes audiencias. Su objetivo es maximizar el impacto de la investigación, asegurando que el conocimiento generado llegue a la comunidad científica, sectores productivos, instituciones gubernamentales y la sociedad en general. Los proyectos de investigación obligatoriamente deberán tener resultados de sus investigaciones. Al comunicar los resultados de un proyecto de investigación en forma de artículo científico, conferencia, capítulo de libro, tesis, etc., no solo cumple con los estándares de la comunidad científica, sino que también contribuirá significativamente al avance del conocimiento, la comunicación efectiva y la validación por pares. Es imperativo incluir la afiliación de la UITEY y agradecimiento correspondiente. Por la naturaleza de la UITEY todo proyecto de investigación de esta categoría debe tener como producto de divulgación al menos un artículo científico indexado para ser registrado.
Productos esperados	Los productos son los resultados tangibles o intangibles que se obtienen tras su ejecución de una o varias actividades y que contribuyen al avance del conocimiento, la solución de un problema o la generación de innovación. Pueden ser reportes, guías técnicas, metodologías, productos de Innovación y Transferencia de Tecnología, entre otras, incluyendo los productos de divulgación científica como son artículos en revistas indexadas, artículos completos (no resúmenes) de congreso publicado en las memorias del evento, ponencias en eventos académicos, posters científicos, etc.
Prórroga	Es una extensión del plazo originalmente establecido para su ejecución, con el fin de completar actividades pendientes, ajustar el cronograma o solventar imprevistos que han retrasado el avance del estudio. Las causas para solicitar una prórroga se encuentran descritas en el punto 6.2.12 de este instructivo.

Término	Definición
	Características de una prórroga: • Debe ser debidamente justificada. • Requiere una actualización del cronograma y, en algunos casos, una reformulación parcial de los objetivos o actividades. • Se establece un nuevo plazo límite, tras el cual se espera la conclusión del proyecto. • Para proyectos de investigación o innovación sin convocatoria el tiempo máximo de prórroga es de 6 meses.
Proyecto de innovación	Se centra en la aplicación práctica de conocimientos existentes para crear soluciones novedosas o mejorar procesos, productos o servicios. El propósito es generar valor mediante la introducción de algo nuevo o mejorado en el mercado. Tiene un enfoque práctico y orientado a resultados, generalmente en el desarrollo experimental e innovación tecnológica. Busca desarrollar algo concreto y aplicar los conocimientos existentes para crear valor en términos de productos, servicios o procesos mejorados. Busca resultados tangibles y aplicables en el mundo real. Generalmente se enfoca en el desarrollo experimental y la comercialización. Los resultados pueden ser nuevos productos, prototipos, mejoras en procesos, o soluciones innovadoras que se pueden comercializar o implementar.
Proyecto de investigación	Los proyectos de investigación buscan comprender fenómenos, probar hipótesis o contribuir al avance del conocimiento en un área específica. Puede tener un enfoque teórico y a menudo implica la recopilación y análisis de datos. Puede no tener una aplicación inmediata y sus resultados pueden contribuir al conocimiento general en el campo. Generalmente se enfoca en investigación básica o aplicada. Busca contribuir al cuerpo de conocimientos existente a través de descubrimientos, teorías o nuevas perspectivas. Los resultados pueden ser publicaciones académicas, presentaciones o informes de investigación.
Riesgos	Los riesgos en un proyecto de investigación se refieren a eventos o situaciones potenciales que podrían afectar negativamente la ejecución del proyecto, su calidad, su cronograma, o la consecución de sus objetivos. La identificación, evaluación, mitigación y monitoreo de riesgos son

Término	Definición
	componentes esenciales de la gestión de proyectos y permiten a los investigadores anticipar y abordar posibles problemas antes de que afecten significativamente al proyecto.
Seguimiento	Presentar informes de avance de un proyecto de investigación es fundamental para el seguimiento del desarrollo del proyecto, identificar problemas a tiempo, y garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Suspensión	Se refiere a la interrupción temporal de las actividades del proyecto, a razones debidamente justificadas. Puede ser solicitada por los directores de los proyectos o un comité ético. La DGII puede suspender la ejecución de un proyecto unilateralmente en cualquiera de los casos descritos en el numeral 6.2.13 de este instructivo. El proyecto puede ser reactivado mediante un informe justificativo.
Tiempo total de ejecución del proyecto	Se refiere al período de tiempo durante el cual se llevará a cabo todo el trabajo planificado dentro del proyecto, desde su inicio hasta su cierre. Este tiempo puede variar significativamente dependiendo de la naturaleza, complejidad y alcance del proyecto de investigación. El tiempo total de ejecución incluye todas las etapas del proyecto, como la planificación, la recopilación de datos, el análisis, la interpretación de resultados, la redacción de informes y la difusión de los hallazgos. También puede abarcar actividades relacionadas con la gestión del proyecto, como reuniones, comunicación con colaboradores y administración de recursos. Es importante establecer un tiempo total de ejecución realista y factible para el proyecto, teniendo en cuenta los recursos disponibles, los plazos de entrega, las restricciones presupuestarias y cualquier otro factor relevante. Un tiempo de ejecución adecuado garantiza que el proyecto se lleve a cabo de manera eficiente y que se alcancen los objetivos establecidos dentro del marco de tiempo previsto. Además, ayuda a mantener el proyecto en curso y a cumplir con los compromisos adquiridos con la institución que financia el proyecto ya sea interno o externo, colaboradores y otras partes interesadas.

Término	Definición
	Para proyectos de investigación o innovación sin convocatoria el tiempo máximo de ejecución es de 2 años.
Zona de delimitación geográfica	Se refiere a la definición clara y específica de los sitios geográficos donde será desarrollado parte o el total del proyecto de investigación.

5. Abreviaturas

Abreviatura	Definición
UITEY	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay
DGII	Dirección General de Investigación e Innovación

6. Consideraciones

6.1. Generales

6.1.1. Todo el personal de la Institución involucrado en el proceso deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas.

6.1.2. El presente procedimiento ha sido desarrollado considerando el marco legal vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a la Dirección General de Planificación y Procesos, y, aplicar los cambios mientras se actualiza la documentación.

Asimismo, en caso de presentarse modificaciones en la estructura orgánica y por ende en las unidades detalladas como responsables de la ejecución de actividades en el procedimiento, las unidades que hagan sus veces deberán asumir las mismas.

6.1.3. Los responsables del procedimiento deberán revisarlo por lo menos una vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad, e identificar posibles mejoras al mismo.

6.1.4. Los proyectos de investigación o innovación comprendidos dentro del alcance del presente procedimiento no contarán con financiamiento directo, sin embargo, podrán usar los recursos (instalaciones, equipos, insumos, y reactivos) y horas de dedicación conforme la distribución de tiempo de cada investigador.

6.1.5. Para la ejecución de los proyectos de investigación se deberá escoger los roles que desempeñarán cada uno de los miembros quienes participarán con actividades específicas apoyando en el efectivo desarrollo del proyecto, los cuales se encuentran descritos en el formulario y detallados a continuación:

- a) **Director:** Debe ser personal académico de la UITEY. Tiene la responsabilidad de supervisar y proporcionar orientación general al equipo de investigación. Esto incluye brindar apoyo a los miembros del equipo, asegurar el cumplimiento de los plazos y garantizar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con los objetivos establecidos, proporcionando liderazgo, orientación y supervisión en diversas áreas. Su experiencia en el área de estudio y compromiso con la exitosa ejecución del proyecto son fundamentales para la realización efectiva de la investigación.
- b) **Codirector:** Debe ser personal académico de la UITEY. Participa en la revisión de documentos clave, como informes de progreso, manuscritos para publicación y cualquier otro material generado durante el proyecto. Participa en la fase inicial de diseño y planificación del proyecto. Contribuye a la revisión y refinamiento de la propuesta de investigación. Proporciona retroalimentación crítica sobre la viabilidad del proyecto, la claridad de los objetivos y la adecuación de la metodología. Participa activamente en la ejecución del proyecto. En caso de ausencia del director del proyecto, es quien deberá realizar las actividades de gestión para dar continuidad a la ejecución del proyecto.
- c) **Personal académico:** Profesor de la UITEY en cualquier modalidad laboral (nombramiento permanente, provisional o contrato ocasional) a tiempo completo, medio o parcial que, debido a su experticia en el campo investigativo relacionado a la temática del proyecto, colabora activamente en la ejecución de las actividades planteadas dentro del proyecto.
- d) **Personal de apoyo académico:** Técnico docente, de laboratorio o de investigación de la UITEY que participa activamente bajo la coordinación del personal académico, en determinadas actividades para la correcta ejecución del proyecto.
- e) **Estudiante de pregrado:** Estudiantes regulares matriculados en una carrera de la UITEY, quienes acorde a las aptitudes y desempeño demostrado, colaborarán en actividades específicas del proyecto bajo la coordinación del personal académico o personal de apoyo académico.
- f) **Estudiante de maestría:** Estudiantes matriculados en un programa de maestría de la UITEY que colaboran en

actividades específicas del proyecto bajo la coordinación del personal académico o personal de apoyo académico.

- g) **Estudiante de doctorado:** Estudiantes matriculados en un programa de doctorado de la UITEY o de otra IES ya sea nacional o extranjera que colaboran en actividades específicas del proyecto bajo la coordinación del personal académico o personal de apoyo académico.
- h) **Personal administrativo:** Personal que labora en la parte administrativa de la UITEY ya sea en modalidad LOSEP o Código de trabajo, que debido a su conocimiento o habilidades participa en el proyecto mediante el desarrollo de actividades afines a la investigación bajo la coordinación del director, sin que esto afecte al correcto desempeño de las actividades administrativas establecidas en su contrato. Este personal no es contratado con fondos del proyecto y es asignado del personal administrativo de las Unidades internas de la Universidad, a partir de una petición del director del Proyecto hacia el jefe inmediato correspondiente, quien podrá dar su aprobación o no.
- i) **Colaborador externo:** Cualquier persona de carácter natural o jurídico, de instituciones públicas o privadas, de IES nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades de docencia, investigación o administración afín a la propuesta del proyecto y que cuenten con el debido permiso de la institución que representan para ejercer las actividades que el director asigne dentro del proyecto. Todo colaborador externo deberá firmar una carta compromiso de cooperación donde se especifique las actividades que desarrollará.

6.1.6. Los impactos relevantes esperados en los proyectos de investigación e innovación deberán ser realistas y estar respaldados por la metodología y los objetivos del proyecto. Esta sección puede ser valiosa para los financiadores, revisores y otros interesados, ya que proporciona una visión de los beneficios prácticos y teóricos que se anticipan como resultado del proyecto de investigación, los impactos considerados pueden ser:

- a) **Impacto social:** Cambios o mejoras en la calidad de vida de las personas, en la sociedad o en la comunidad en general.
- b) **Impacto científico:** Se refiere a la contribución significativa y valiosa al avance del conocimiento en un campo específico. El impacto científico puede manifestarse a través de descubrimientos novedosos, teorías innovadoras, métodos de investigación mejorados, o la resolución de preguntas fundamentales en una disciplina.

- c) **Impacto económico:** Implica generar cambios positivos en la economía, ya sea a nivel local, regional o nacional. Este impacto puede manifestarse a través de la creación de empleo, el desarrollo de nuevas industrias, la mejora de la productividad, la generación de ingresos o la promoción de la innovación económica. La investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos suelen contribuir al impacto económico.
- d) **Impacto ambiental:** Hace referencia a los efectos positivos en el entorno natural y la sostenibilidad del medio ambiente. Puede incluir la identificación y aplicación de prácticas más sostenibles, la mitigación de impactos ambientales negativos, el desarrollo de tecnologías verdes o la contribución a la conservación de la biodiversidad. Las investigaciones centradas en problemas ambientales o en la mejora de prácticas sostenibles pueden tener un impacto ambiental significativo.

Cabe destacar que estos tipos de impacto no son mutuamente excluyentes y, en muchos casos, pueden estar interrelacionados.

- 6.1.7.** La metodología que se deberá aplicar a los proyectos de investigación se refiere al conjunto de procesos, técnicas, enfoques y herramientas que el investigador planea utilizar para llevar a cabo la investigación y responder a las preguntas de investigación o alcanzar los objetivos propuestos. En otras palabras, la metodología describe el camino que seguirá el investigador para recopilar datos, analizarlos y llegar a conclusiones.

Algunos elementos comunes que se incluyen en la sección de metodología de un proyecto de investigación son:

- a) **Diseño de investigación:** Describe la estructura general de la investigación, ya sea experimental, cuasiexperimental, descriptiva, correlacional, cualitativa, cuantitativa, entre otros.
- b) **Población y muestra:** Especifica la población o grupo de interés para el estudio y cómo se seleccionará la muestra, si es aplicable.
- c) **Instrumentos y herramientas:** Detalla los instrumentos de recolección de datos y cualquier tecnología o herramienta específica que se utilizará.
- d) **Procedimientos de recopilación de datos:** Explica paso a paso cómo se llevará a cabo la recopilación de datos.
- e) **Análisis de datos:** Describe los métodos estadísticos o cualitativos que se utilizarán para analizar los datos

recopilados. Esto puede incluir pruebas estadísticas, análisis de contenido, técnicas de codificación, etc.

- f) **Consideraciones éticas:** Discute cualquier preocupación ética relacionada con la investigación, como la privacidad de los participantes, el consentimiento informado y la confidencialidad.
- g) **Limitaciones y delimitaciones:** Reconoce y describe cualquier limitación o restricción en el diseño o la ejecución de la investigación.

6.1.8. Los proyectos de investigación que lo requieran estarán sujetos a la revisión ética de la investigación, para asegurar que se cumplan los estándares éticos y que se protejan los derechos de los participantes. Los formularios que lo requieran pasarán a revisión del Comité de Ética en Investigación de la UITEY el cual resolverá la posterior necesidad de que sean evaluados por comités específicos que según el caso pueden ser:

1. **Comité de Ética en Seres Humanos (CEISH):** Este Comité tiene el propósito de proteger la dignidad, los derechos, el bienestar y la seguridad de los seres humanos participantes en estudios de salud, así como salvaguardar los derechos y bienestar de los sujetos en cualquier actividad de investigación en salud, independiente de la fuente de financiamiento.
2. **Comité de Investigación en animales:** Este comité se encarga de evaluar y aprobar proyectos de investigación que involucren el uso de animales con fines de estudio. Este reglamento garantiza que todas las investigaciones que involucren el uso de animales se realicen de manera ética y conforme a los más altos estándares de cuidado y bienestar animal, así como en línea con los principios en cuanto a investigación, responsabilidad y respeto por la vida animal.

2.1.1. Es responsabilidad de cada una de las unidades académicas designar a un Coordinador de Investigación, quien deberá realizar la revisión técnica de cada uno de los proyectos correspondientes a su unidad, entendiéndose estos como aquellos cuyos directores estén adscritos a dicha unidad.

2.1.2. Los proyectos de investigación o innovación que involucren análisis con humanos o animales deberán contar con la respectiva aprobación y autorización emitida por el Comité de Ética respectivo.

2.2. Específicas

Presentación de proyectos de investigación o innovación

- 2.2.1. Si los proyectos de investigación o innovación sin convocatoria son sometidos como grupo de investigación, este deberá estar registrados en la DGII conforme el procedimiento establecido para el efecto y el director del proyecto deberá ser parte de este grupo.
- 2.2.2. En la parte correspondiente al uso de recursos disponibles en la UITEY, se deberá detallar los equipos a usar dentro del proyecto con su tiempo estimado.
- 2.2.3. Previo a la aprobación del proyecto de investigación o innovación por parte de la autoridad de la unidad académica a la que pertenece el director del proyecto, este deberá contar con la revisión y el aval del coordinador de investigación de la respectiva unidad académica (revisión de fondo -técnica-) y de la DGII (revisión de forma – administrativa-).
- 2.2.4. En casos donde exista participación de 2 o más unidades académicas, la autoridad de cada unidad académica involucrada en el proyecto a través de su personal académico y de apoyo, así como de los recursos materiales (instalaciones, equipos, insumos, reactivos) a su cargo deberá avalar la participación del personal y el uso de recursos.
- 2.2.5. Aquellos proyectos que registren colaboradores externos, previo a la aprobación por parte de la autoridad de la unidad académica, deberán adjuntar cartas de compromiso de cooperación firmado por el colaborador en mención.
- 2.2.6. Los proyectos en los que la autoridad de una unidad académica participe como director deberán ser aprobados por el Vicerrector Académico.
- 2.2.7. El profesor deberá ingresar a través del sistema de gestión por procesos, el proyecto de investigación o innovación con al menos un mes antes de la fecha de inicio esperado de ejecución de actividades.

Ejecución, seguimiento y cierre de proyectos de investigación

- 2.2.8. El director del proyecto de investigación o innovación es el responsable de emitir los respectivos informes de avance sobre la ejecución del proyecto, conforme la planificación establecida.
- 2.2.9. Los informes de avance e informe de cierre deberán ir acompañados de los respectivos evidenciables, conforme a lo

detallado en los productos esperados y el plan de difusión del proyecto de investigación o innovación.

2.2.10. En el caso de que existan retrasos o incumplimientos en las actividades planificadas, es responsabilidad del director del proyecto establecer las acciones correctivas correspondientes.

2.2.11. El director del proyecto de investigación podrá solicitar una prórroga de la ejecución del proyecto de investigación o de hasta 6 meses, siempre y cuando se haya cumplido al menos el 70% de actividades.

2.2.12. Causales para solicitar una prórroga:

- a. Retrasos en la recolección de datos (por dificultades logísticas o falta de acceso a información clave).
- b. Modificaciones en la metodología que requieran más tiempo para su implementación.
- c. Dificultades administrativas o regulatorias, como demoras en la aprobación de permisos o revisiones éticas.
- d. Factores externos que afecten el desarrollo del proyecto (ejemplo: crisis sanitarias, restricciones de movilidad, condiciones climáticas adversas).

2.2.13. La suspensión de los proyectos de investigación procederá únicamente por decisión debidamente motivada, emitida por alguno de los siguientes actores: el director del proyecto, la autoridad de la unidad académica a la que pertenece el director del proyecto, o el director general de investigación e innovación.

2.2.14. La DGII podrá cancelar un proyecto unilateralmente, siempre precedido de un periodo de suspensión, en cualquiera de los casos descritos en el siguiente numeral.

2.2.15. Causales para considerar la suspensión de un proyecto de investigación:

- a. Maternidad: En el caso de que la directora del proyecto se encuentre en su licencia por el nacimiento de su hija/o y el proyecto no contemple un codirector.
- b. Fallo en la metodología: Diseños experimentales inadecuados, errores en la planificación o imposibilidad de recolectar datos válidos.
- c. Resultados inconclusos o inconsistentes: Si los datos obtenidos no son útiles o no se pueden interpretar de manera coherente, el proyecto puede detenerse.


- d. Limitaciones tecnológicas: Falta de acceso a equipos, software o técnicas necesarias para ejecutar el proyecto.
- e. Imposibilidad de replicar resultados previos: Esto puede llevar a dudas sobre la validez de la investigación en curso.
- f. Falta de aprobación de un comité de ética: En caso de no obtener o perder el aval ético requerido para proceder.
- g. Riesgos imprevistos para los participantes: Si se identifican riesgos para la salud, seguridad o bienestar de los sujetos involucrados.
- h. Avances científicos o tecnológicos: Descubrimientos recientes pueden hacer que el proyecto pierda relevancia o se vuelva obsoleto.
- i. Cambios en el entorno social, político o económico: Crisis, conflictos o cambios regulatorios que dificulten la ejecución del proyecto.
- j. Redundancia con otros proyectos: Si otro equipo de investigación pública resultados similares antes de la conclusión del proyecto, este podría considerarse innecesario.
- k. Falta de personal capacitado: Problemas en la conformación o sostenibilidad del equipo investigador.
- l. Desastres naturales o emergencias: Eventos inesperados como pandemias, terremotos o conflictos armados que dificulten la investigación.
- m. Acceso restringido a lugares o materiales de estudio: Problemas logísticos o restricciones legales que impidan la recopilación de datos.
- n. Incumplimiento en entrega de informes de avance o cierre en los plazos establecidos.
- o. Incumplimiento de plazos para entrega de productos esperados incluyendo el plan de difusión.
- p. Problemas legales o administrativos: Conflictos con permisos, contratos, o normativas que impiden la continuidad del proyecto.
- q. Violación de principios éticos: Si el proyecto no respeta normas éticas relacionadas con el trato a los participantes humanos o animales.
- r. Falsificación o manipulación de datos: Prácticas fraudulentas pueden llevar a la suspensión inmediata del proyecto.
- s. Desacuerdos entre investigadores: Conflictos internos que afecten la coordinación y ejecución del proyecto.
- t. Falta de progreso significativo: Si los informes de avance y/o cierre muestran resultados insatisfactorios o que no justifican continuar, con un avance menor al 50% de las actividades planificadas.

u. Renuncia o fallecimiento del director del proyecto: Puede ser un motivo para suspender el proyecto, especialmente si no hay un codirector designado.


- 2.2.16.** Los proyectos de investigación suspendidos podrán ser reactivados, previa presentación de un informe justificativo emitido por el director del proyecto. En caso de ausencia definitiva del director, el informe deberá ser emitido por la autoridad de la unidad académica a la que este pertenecía. El informe deberá estar dirigido a la Dirección General de Investigación e Innovación (DGII) o a la autoridad académica correspondiente, según quién haya dispuesto la suspensión del proyecto.
- 2.2.17.** La solicitud de reactivación de proyectos de investigación deberá presentarse dentro de un plazo máximo de seis meses (180 días) contados desde el inicio de la suspensión. Vencido dicho plazo sin la presentación del informe, la DGII procederá a cancelar el proyecto de manera definitiva.
- 2.2.18.** El director de un proyecto cancelado no podrá presentar o dirigir otro proyecto de investigación de cualquier tipo en la UITEY durante los dos siguientes periodos académicos ordinarios. La UITEY se reservará su auspicio para postulaciones externas previo análisis del motivo de la cancelación.
- 2.2.19.** Los proyectos de investigación cerrarán una vez que se ha cumplido con (i) el periodo de ejecución y/o prórroga, (ii) el cumplimiento superior al 50% de las actividades planificadas, y (iii) la entrega de los productos esperados incluyendo el plan de difusión que fueron establecidos en la propuesta del proyecto.
- 2.2.20.** En los artículos científicos publicados en revistas indexadas, artículos de congreso completos (no resúmenes) publicados en las memorias del evento, póster, ponencias, libros o capítulos de libro, y demás productos resultados del proyecto, deberá constar el agradecimiento a la UITEY bajo el siguiente formato: *"The authors thanks to Yachay Tech University for the support given to the project <CÓDIGO DEL PROYECTO>"* o su equivalente en español.
- 2.2.21.** Los artículos científicos publicados en revistas indexadas, artículos de congreso completos (no resúmenes) publicados en las memorias del evento, póster, ponencias, libros o capítulos de libro, y demás productos resultados de los proyectos de los proyectos de grupos de investigación, deberán también contener la afiliación al grupo.

2.2.22. El director del proyecto puede solicitar certificados o constancias de ejecución de proyectos, siempre y cuando, el proyecto haya sido cerrado exitosamente.


3. Diagrama de flujo

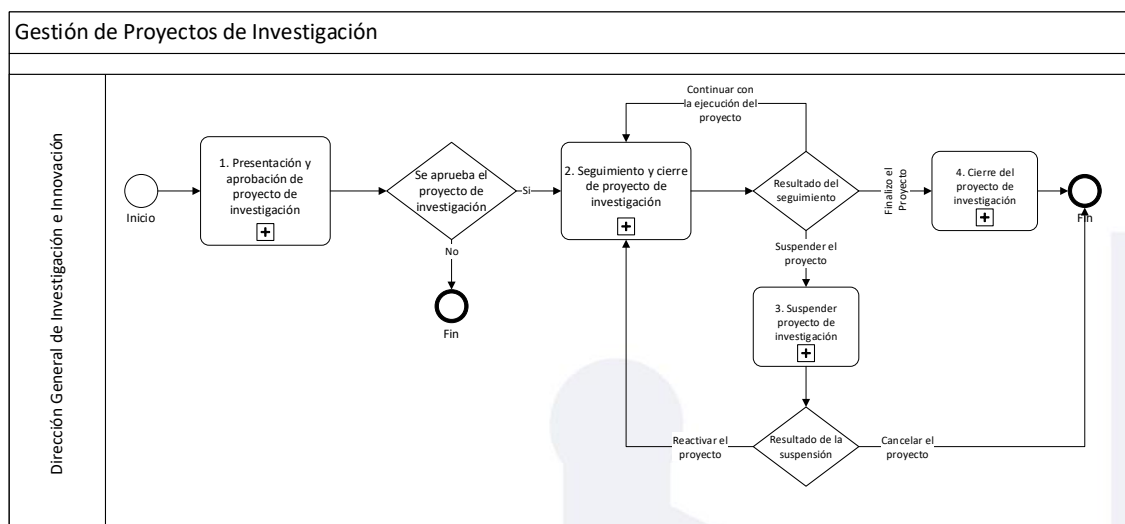


3.1. Presentación de Proyecto de Investigación o Innovación

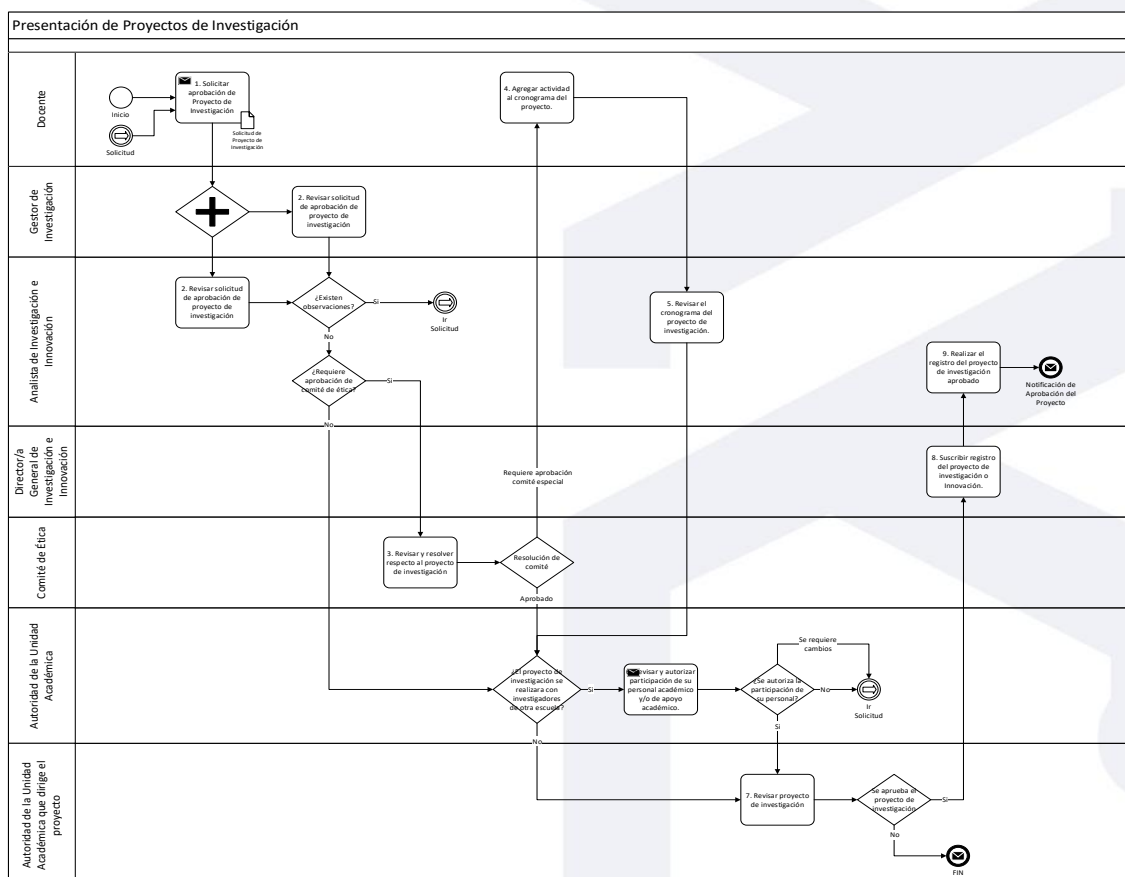


3.2. Seguimiento de proyectos de investigación o innovación

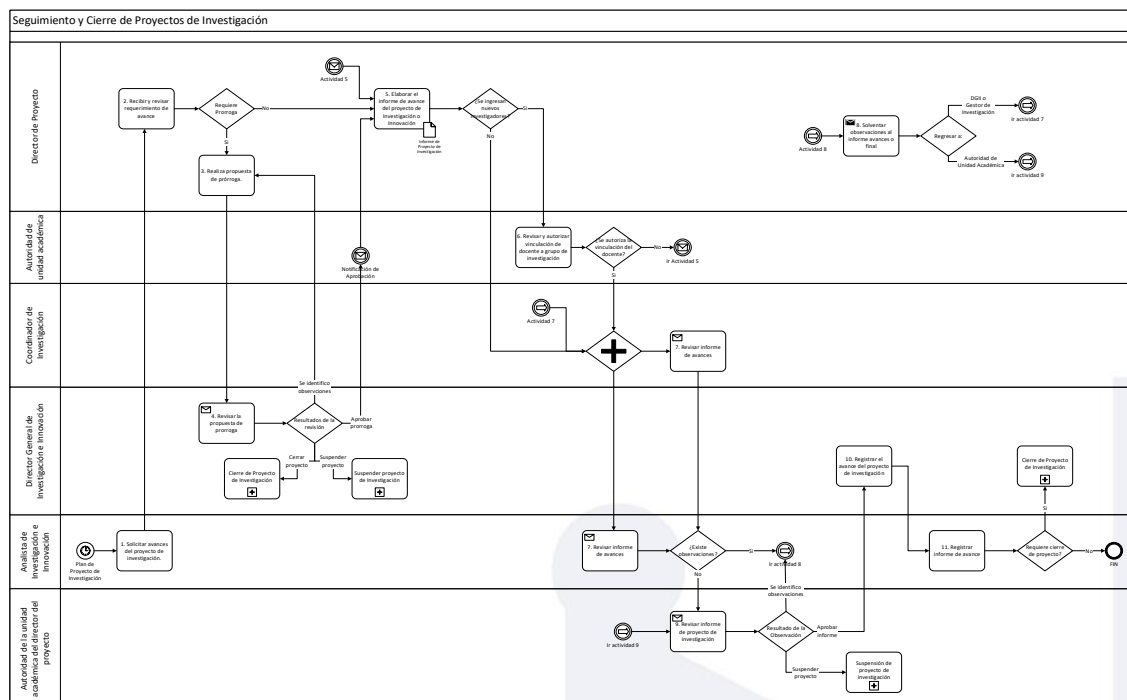

3.3. Suspensión y cancelación de proyectos de investigación e innovación

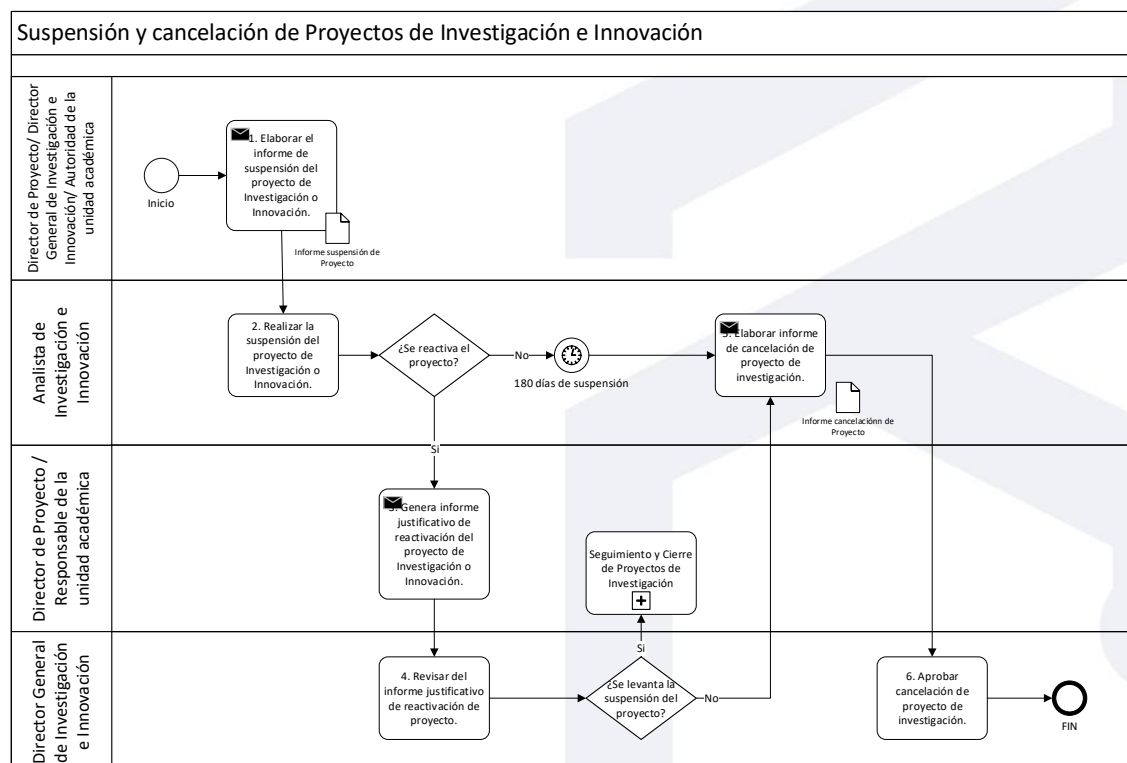

3.4. Cierre de proyectos de investigación e innovación

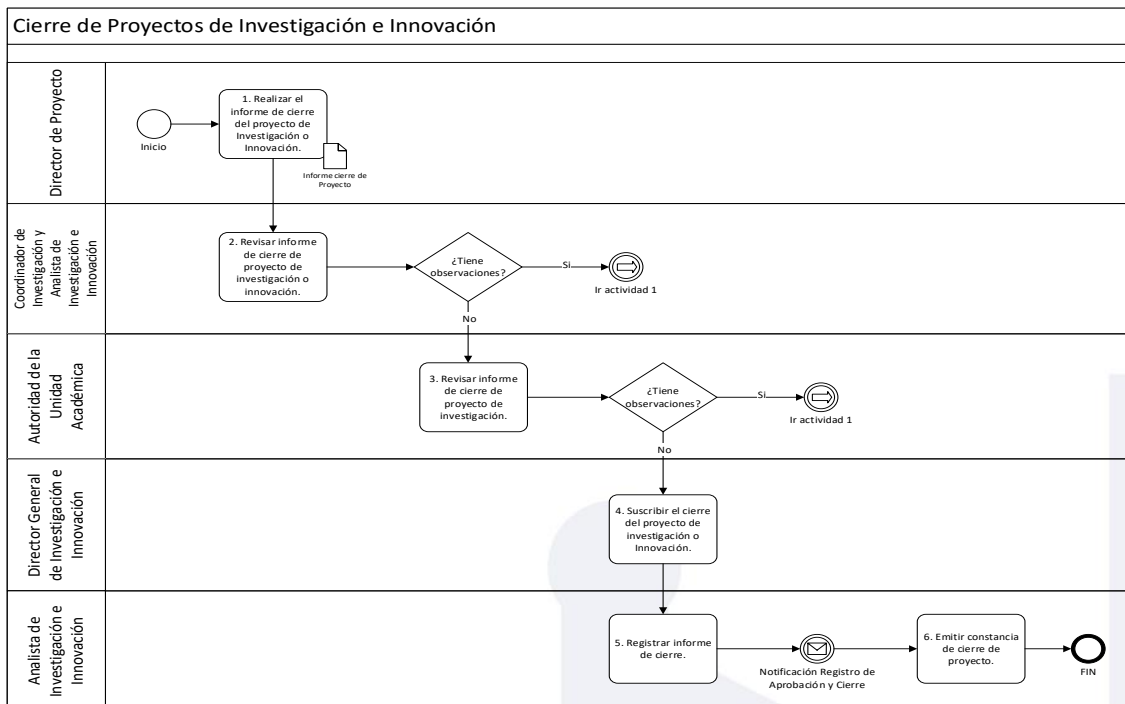

4. Detalle de actividades

4.1. Presentación de proyecto de investigación e innovación

Nro.	Responsable	Descripción de actividad
1.	Personal académico	Solicitar aprobación de proyecto de investigación Completar el formulario de gestión de proyectos en el sistema de gestión por procesos.
2.	Coordinador de investigación y analista de investigación e innovación	Revisar solicitud de aprobación de proyecto de investigación. De manera paralela se realiza la revisión por parte del Coordinador de Investigación y el Analista de Investigación e Innovación. El coordinador de investigación realiza la revisión técnica de los temas de fondo de la propuesta de proyecto de investigación, y el Analista deberá realizar la revisión administrativa de los temas de forma de la propuesta del proyecto de investigación. En el caso de que uno de los dos actores identifique observaciones, vuelve a la

		actividad 1, para solventar las observaciones. - En caso de que la propuesta del proyecto de investigación requiera la revisión del Comité de Ética, continúa con la actividad 3. - En caso de que el proyecto no tenga observaciones y se realice en con investigadores varias unidades académicas, continúa con la actividad 6, caso contrario, continúa con la actividad 7.
3.	Comité de ética en procesos de investigación	Revisar y resolver respecto al proyecto de investigación. Esta revisión se realiza en los casos considerados en el numeral 6.1.6. - En caso de que se resuelva la aprobación del proyecto, continúa con la actividad 6. - En caso de que se resuelva la necesidad de revisión por parte de un comité especializado en seres humanos o animales, continúa con la actividad 4.
4.	Director de proyecto	Agregar actividad al cronograma del proyecto. Se agrega una actividad en el cronograma del proyecto correspondiente a la obtención del permiso del Comité de Ética Especializado.
5.	Analista de investigación e innovación	Revisar el cronograma del proyecto de investigación. Realiza la revisión del cronograma del proyecto, con la finalidad de identificar que se haya incluido la actividad para “gestionar la obtención de permisos de comités de ética especializados”. Continúa con la actividad 7.
6.	Autoridades de las unidades académicas	Revisar y autorizar participación de su personal académico y/o de apoyo académico. La autoridad de la unidad académica respectiva de cada uno de los investigadores que integran el proyecto revisará que las horas destinadas para la ejecución de las actividades se encuentre acorde a las horas del distributivo.

		- En el caso de autorizar la participación de el o los investigadores en el proyecto, continúa con la actividad 7. - En el caso de requerir cambios en las horas de dedicación de el o los investigadores o no aprueba la participación de el o los investigadores en el proyecto, se devuelve a la actividad 1 para modificar la solicitud conforme las observaciones emitidas.
7.	Autoridad de la unidad académica a la que pertenece el director del proyecto	Revisar proyecto de investigación o innovación Se revisa la propuesta de proyecto considerando los parámetros investigativos establecidos y su correspondencia con las líneas de investigación definidas por la universidad. - Si el proyecto es aprobado, se continúa con la actividad 7. - Si el proyecto requiere ajustes, se devuelve a la actividad 1 a través del sistema de gestión por procesos, con el fin de que el solicitante modifique la propuesta conforme a las observaciones emitidas. - Si el proyecto no es aprobado, se notifica la decisión debidamente sustentada mediante el sistema de gestión por procesos, dándose por concluido el trámite.
8.	Director general de investigación e innovación	Suscribir registro del proyecto de investigación o Innovación. Una vez que el proyecto sea aprobado se suscribe el registro del proyecto.
9.	Analista de investigación e innovación	Realizar el registro del proyecto de investigación aprobado Se realiza el registro del proyecto aprobado en la matriz de proyectos de investigación que dispone la Dirección de Investigación e Innovación

4.2. Seguimiento de proyectos de investigación e innovación

Nro	Responsable	Descripción de Actividad
1.	Analista de investigación e innovación	Solicitar avances del proyecto de investigación.

		De conformidad con los plazos establecidos por la Dirección General de Investigación e Innovación (DGI), y una vez que el proyecto haya estado en ejecución por al menos cuatro meses, se solicita a los directores de proyecto, a través del sistema de gestión por procesos, la presentación del respectivo reporte de avance de cada uno de los proyectos. De igual manera determina si es posible que el director del proyecto pueda solicitar una prórroga del proyecto.
2.	Director de proyecto	Recibir y revisar requerimiento de avance Una vez receptada la solicitud de avance del proyecto determina la necesidad de solicitar una prórroga para el proyecto de investigación. - En el caso de que se requiera realizar una prórroga a la ejecución del proyecto, continúa con la actividad 3, - En el caso de no requerir prórroga, continúa con la actividad 5.
3.	Director del proyecto	Realiza propuesta de prórroga. Se solicita la propuesta de prórroga a través del sistema de gestión por procesos.
4.	Director general de investigación e innovación	Revisar propuesta de prórroga Realiza la revisión de la propuesta de prórroga, y determina si es procedente la prórroga, se suspende o se cierra el proyecto. - En caso de estar de acuerdo con la propuesta de prórroga, y aprueba la misma, continúa con la actividad 5; - En caso de identificar observaciones, solicita al director del proyecto, la corrección de las mismas, mediante el sistema de gestión por procesos, volviendo a la actividad 3. - En el caso que corresponda, el proyecto procederá a cerrarse, continúa la actividad 1 del cierre de proyectos, - En caso de suspenderse el proyecto, continúa a la actividad 1 de la Suspensión y cancelación de proyectos.
5.	Director del proyecto	Elaborar el informe de avance del proyecto de Investigación o Innovación

		Registra los avances alcanzados durante la ejecución del proyecto, en el sistema de gestión por procesos, elabora el informe de avances y lo remite mediante el sistema de gestión por procesos. - En el caso de incluir nuevos investigadores al proyecto, continúa con la actividad 6, - En caso de que no exista cambios en los integrantes, continúa con la actividad 7.
6.	Autoridades de las unidades académicas	Revisar y autorizar la vinculación de personal académico y personal de apoyo académico al proyecto Verifica que el tiempo de dedicación ingresado para la ejecución de las actividades señaladas en el proyecto se encuentren acorde con en el distributivo. - En el caso de aprobar la vinculación de el o los investigadores de su unidad académica al proyecto, continúa con la actividad 7, - Caso contrario, notifica las observaciones al director del proyecto y vuelve a la actividad 5 para solventar las mismas.
7.	Coordinador de investigación y analista de investigación e innovación	Revisar informe de proyecto de investigación o innovación. De manera paralela se realiza la revisión del informe por parte del Coordinador de Investigación, y el Analista de Investigación e Innovación, según sus competencias. - En el caso de identificar observaciones se devuelve el informe al Director del Proyecto, continúa con la actividad 8. - En el caso de no identificar observaciones, continúa con la actividad 9.
8.	Director de proyecto de investigación	Solventar observaciones al informe del proyecto de investigación. Solventa las observaciones realizadas por actor revisor, y lo remite mediante el sistema de gestión por procesos.
9.	Autoridad de la unidad académica	Revisar informe de proyecto de investigación.

		Realiza la revisión integral del informe, y determina la aprobación del informe o de ser el caso la suspensión del proyecto • En caso de estar de acuerdo con el informe de avance indica su validación en el sistema de gestión por procesos y continúa con la actividad 10; • En caso de identificar observaciones, regresa a la actividad 8. • En caso de que de manera sustentada considera que se requiere realizar la suspensión del proyecto, continúa con la actividad 1 del sub proceso suspensión o cancelación de proyectos de investigación.
10.	Director general de investigación e innovación	Registrar el avance del proyecto de investigación o Innovación. Una vez que el informe sea aprobado, el director general de Investigación e Innovación firma el registro del avance de proyecto.
11.	Analista de investigación e innovación	Registrar informe de avance Una vez que el informe cuenta con la revisión y aprobación de las diferentes unidades y actores, se incluye el informe de avance del proyecto en la matriz de seguimiento. Finalmente notificará al director del proyecto, mediante el sistema de gestión por procesos el registro y aprobación de este. • En caso de que se identifique la necesidad de realizar el cierre del proyecto, continúa con la actividad 1 del subproceso cierre de proyectos de investigación. • En caso de que no se identifique observaciones, se da por finalizado el subproceso.

4.3. Suspensión y cancelación de Proyectos de Investigación e Innovación

Nro	Responsable	Descripción de Actividad
1.	Director del proyecto Director General de Investigación e Innovación	Elabora el informe de suspensión del proyecto de Investigación o Innovación Una vez que uno de los responsables de esta actividad identifique de manera sustentada que existe una causal para realizar la suspensión del proyecto, elabora

	Autoridad de la unidad académica	el informe de suspensión del proyecto debidamente suscrito y lo remite mediante el sistema de gestión por procesos.
2.	Analista de investigación e innovación	Realiza suspensión del proyecto de Investigación o Innovación Se registra la suspensión del proyecto, con un plazo máximo de 6 meses.
3.	Director de proyecto Autoridad de la unidad académica	Genera informe justificativo de reactivación del proyecto de Investigación o Innovación Previo a la finalización del plazo, de manera fundamentada elabora el informe de reactivación del proyecto dirigido al actor que dispuso la suspensión y continúa con la actividad 4. En el caso de no recibir la justificación en el plazo determinado se continúa con la actividad 5.
4.	Director general de investigación e innovación	Revisión del informe justificativo de reactivación de proyecto Realiza la revisión de la justificación de reactivación. - En caso de estar de acuerdo se levanta la suspensión y se pasa a la actividad 1 del seguimiento o cierre del proyecto, según corresponda. - En el caso de no aprobar la justificación, continúa con la actividad 5.
5.	Analista de Investigación e Innovación	Elaborar informe de cancelación de proyecto de investigación Una vez finalizado el plazo de suspensión del proyecto, se elabora el informe de cancelación y se lo remite mediante el sistema de gestión por procesos.
6.	Director general de investigación e innovación	Aprobar cancelación de proyecto de investigación. Revisa y realiza la aprobación del informe de cancelación del proyecto, a través del sistema de gestión por procesos. El sistema remite de manera automática la notificación de cancelación del proyecto, dirigida al director del proyecto y a la autoridad de la unidad académica a la que pertenece el director del proyecto.

4.4. Cierre de proyectos de investigación e innovación

Nro	Responsable	Descripción de Actividad
1.	Director del proyecto	Realizar el informe de cierre del proyecto de Investigación o Innovación Se elabora el informe de cierre de proyecto de investigación y lo remite a la DGII a través del sistema de gestión por procesos.
2.	Coordinador de investigación y analista de investigación e innovación	Revisar informe de cierre de proyecto de investigación o innovación. De manera paralela se realiza la revisión del informe por parte del Coordinador de Investigación, y el Analista de Investigación e Innovación, según sus competencias. - En el caso de identificar observaciones, se devuelve el informe al Director del Proyecto y se continúa con la actividad 1. - En el caso de no identificar observaciones, continúa con la actividad 3.
3.	Autoridad de la unidad académica	Revisar informe de cierre de proyecto de investigación. Realiza la revisión integral del informe, - En el caso de no identificar observaciones en el informe, continúa con la actividad 4; y - En caso de identificar observaciones regresa a la actividad 1.
4.	Director General de Investigación e Innovación	Suscribe el informe de cierre del proyecto de investigación o innovación. Una vez que el informe sea aprobado, el director general de Investigación e Innovación firma el registro de cierre de proyecto.
5.	Analista de Investigación e Innovación	Registrar cierre Una vez que el informe cuenta con la revisión y aprobación de las diferentes unidades y actores, se incluye el informe de cierre del proyecto en la matriz de seguimiento. Se notifica al director del proyecto, mediante el sistema de gestión por procesos, el registro y la aprobación del mismo.
6.	Analista de Investigación e Innovación	Emitir constancia de cierre de proyecto Finalmente se emite la notificación de cierre de proyecto respectiva.

5. Formatos

Código	Formato
GIN-DGI-PRD-001-FO-001	Formulario de Presentación de Proyectos de Investigación o Innovación sin Convocatoria
GIN-DGI-PRD-001-FO-002	Formulario de Informe de avance de Proyecto de Investigación o Innovación sin convocatoria
GIN-DGI-PRD-001-FO-003	Formulario de Informe de cierre de Proyecto de Investigación o Innovación sin convocatoria
GIN-DGI-PRD-001-FO-004	Formato de solicitud de prórroga de Proyecto de Investigación o Innovación sin convocatoria

6. Normativa base

- 6.1. Ley Orgánica de Educación Superior
- 6.2. Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior
- 6.3. Distribución del tiempo de dedicación del personal académico de la UITEY

7. Indicadores del procedimiento

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Responsable
Solicitudes atendidas	(# de solicitudes atendidas / # de solicitudes receptadas) *100	100%	Semestral	Dirección general de investigación e innovación

8. Riesgos operacionales del procedimiento

Riesgo Identificado	Actividad de Control	Responsable
R1. Incluir a personal académico y personal de apoyo académico en los proyectos de investigación, y que no cuenten con la autorización de la autoridad de la unidad académica respectiva	Actividad 6 del subproceso Presentación de proyectos y actividad 2 del subproceso Seguimiento y cierre de proyectos. Revisar y autorizar participación de su personal académico y personal de apoyo académico.	Autoridad de la unidad académica

9. Histórico de cambios

Responsable	Fecha	Motivo del Cambio
Dirección de Investigación e Innovación	16/05/2025	Emisión de documento inicial
